
3º DISPOSITIVOS DE ANCLAJE · M5 A M8

Equipos para aplomar, fijar, inyectar y ajustar las uniones durante y después del montaje

M5 Puntales telescópicos


Vista 1:150 · arriostre provisorio de columnas

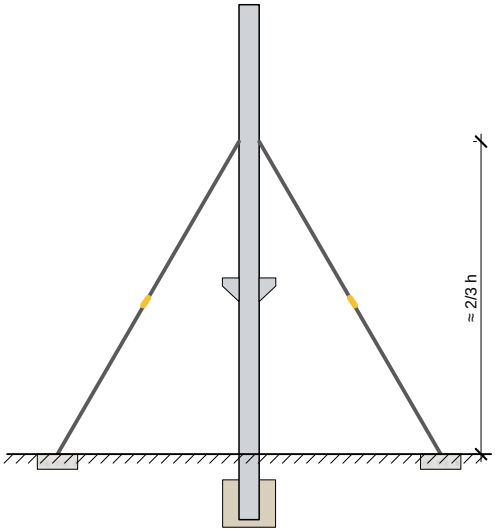

- 2 puntales regulables (4-7 m) por columna, a 90° entre sí, anclados a muertos de H° o placas con brocas.
- Se retiran cuando el grout del cáliz alcanza su resistencia (24-48 h).

M6 Plataforma elevadora articulada


Vista 1:150 · montaje y sellado de fachada

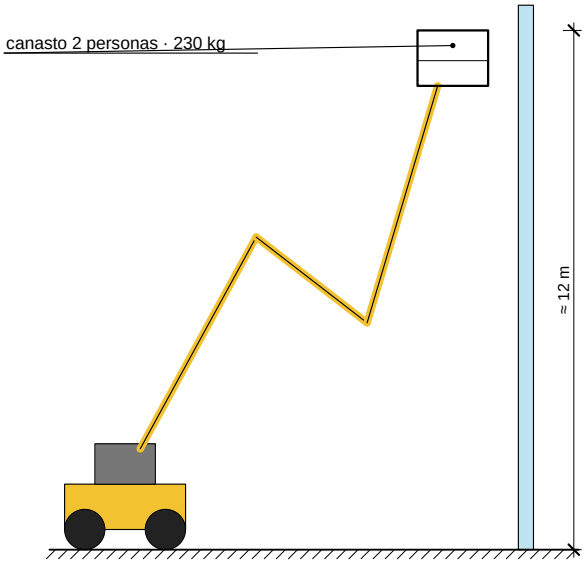

- Brazo articulado de 12 m de trabajo: colocación de vidrios, presores y sellados del muro cortina y juntas de paneles.
- Se alquila sin operador: lo maneja personal capacitado.

M7 Equipo de grouteo


1:50 · mezcladora + bomba + manguera

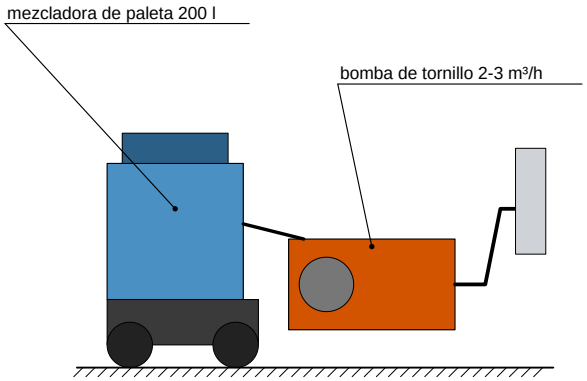

- Inyecta el grout sin retracción en cálices, vainas de pernos y juntas.
- Se inyecta desde abajo hasta que sale por el purgador (sin aire atrapado).

M8 Herramientas de anclaje

1:20

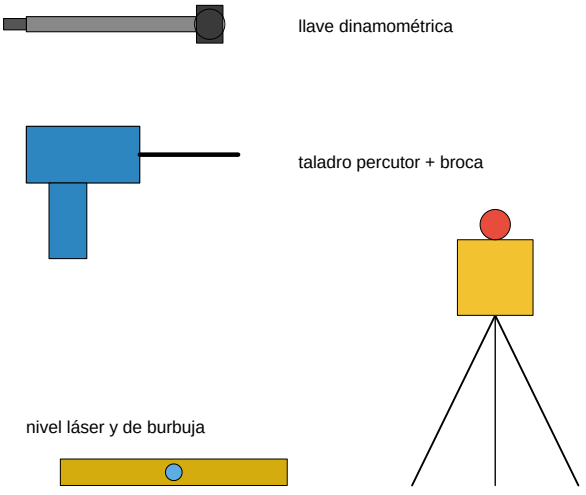

- Llave dinamométrica: aprieta bulones M12-M20 al torque de proyecto.
- Taladro + brocas Ø9,5; nivel láser / estación total: replanteo y aplomado ± 5 mm.

C2 · PRÁCTICA EN CLASE H° premoldeado de grandes luces	DOCENTE: Arq. Tucci y Arq. Cardozo ALUMNA: Candelaria Vitale · GRUPO 13	**CONSTRUCCIONES II** CÁTEDRA: ARQ. TUCCI
M5-M8 · ANCLAJE EN OBRA Escalas: puntales y plataforma 1:150 · grouteo 1:50 · herramientas 1:20		**LÁMINA 18/26** A4 vertical · 22/10/2026
