
3º MÁQUINAS · ACCESO A OBRA E IMPLANTACIÓN

Dónde entra, se arma y trabaja la grúa · montaje en retroceso (de fondo a frente) · lote 60 x 48 m

IMPLANTACIÓN DE OBRA

esc. 1:500

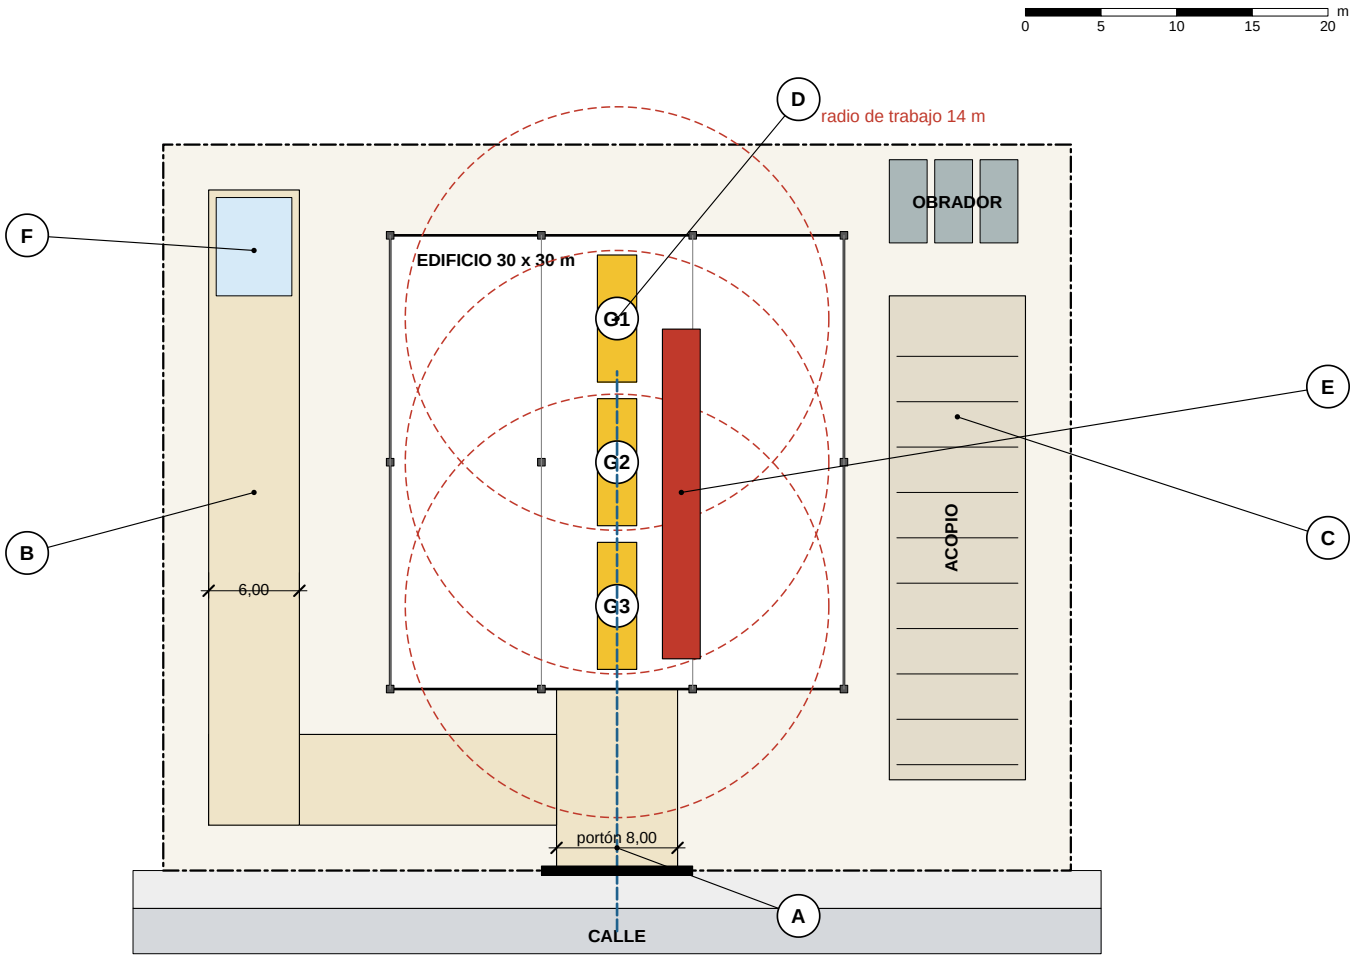

- (A) Acceso: portón 8 m, camino de tosca compactada 30 cm, ancho ≥ 6 m, pendiente ≤ 8 %
- (B) Calle interna p/ equipos menores y hormigón de la capa (mixer + bomba)
- (C) Acopio mínimo de piezas, ordenadas según el montaje, sobre tacos
- (D) Estaciones de la grúa G1 → G2 → G3: monta de fondo a frente y sale por el acceso
- (E) Carretón junto a la grúa: izaje directo desde el camión (just in time)
- (F) Plataforma elevadora y equipo de grouteo

CONDICIONES DE ACCESO (verificar antes de contratar)

Camino: ancho libre ≥ 6 m (carretón 2,60 m + maniobra), radio de giro exterior ≥ 15 m, pendiente ≤ 8 %, base compactada.
Gálibo: altura libre ≥ 4,50 m en el recorrido; sin líneas aéreas a menos de 5 m de la pluma.
Calle: señalización, banderilleros y corte parcial en el horario autorizado por el municipio (piezas > 12 m).

C2 · PRÁCTICA EN CLASE H° premoldeado de grandes luces	DOCENTE: Arq. Tucci y Arq. Cardozo ALUMNA: Candelaria Vitale · GRUPO 13	**CONSTRUCCIONES II** CÁTEDRA: ARQ. TUCCI
ACCESO A OBRA · IMPLANTACIÓN Escalas: planta 1:500		**LÁMINA 19/26** A4 vertical · 22/10/2026
