
DETALLE 1 · NUDO CUBIERTA

AXONOMETRÍA · ESC. APROX. 1:22

Parapeto (panel sándwich) – viga "L" – losa alveolar – remate del muro cortina

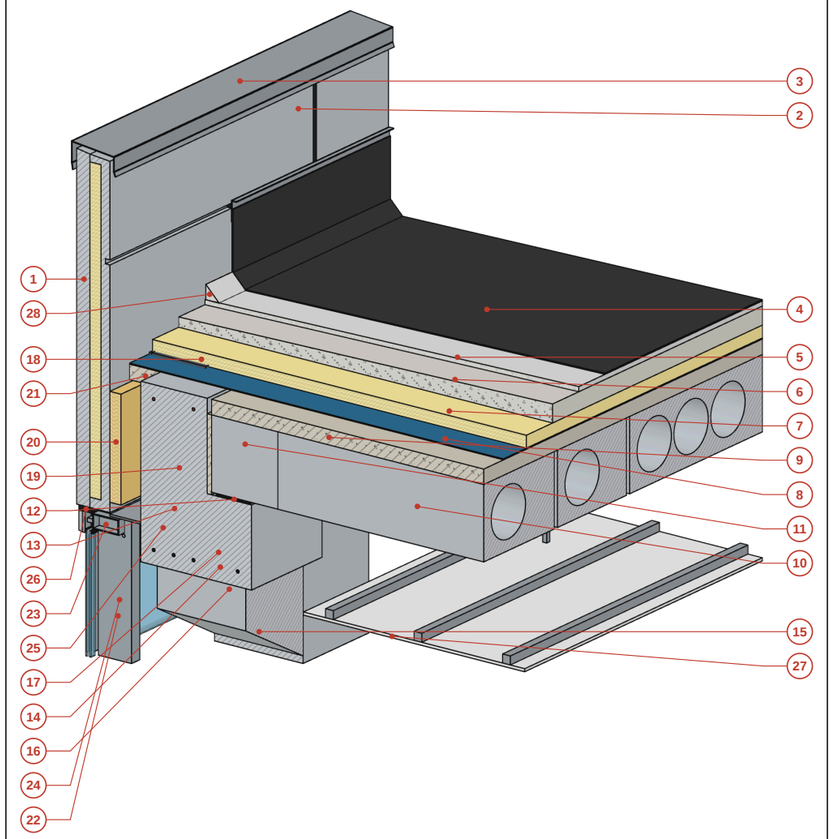


1 Panel sándwich premoldeado (cenefa/parapeto): H°A° 6 + EPS 5 + H°A° 4 cm, conectores inox.
2 Junta vertical entre paneles 20 mm: fondo de junta + sellador poliuretánico.
3 Cupertina chapa galv. N°22 plegada c/ goterones; tornillo + sellador.
4 Membrana asfáltica 4 mm c/ geotextil; babeta en buña + perfil chapa + sellador.
5 Carpeta cementicia 1:3, e = 2 cm.
6 H° de pendiente alivianado, mín. 4 cm, pend. 2 % a canaleta.
7 Aislación térmica EPS 30 kg/m³, e = 5 cm.
8 Barrera de vapor: imprimación asfáltica + film 200 µ.
9 Capa de compresión H°A° in situ 6 cm c/ malla Q188.
10 Losa alveolar pretensada e = 30 cm (alvéolos Ø 21 cm).
11 Tapón de H° en alvéolos, zona de apoyo (30 cm).
12 Apoyo de neopreno continuo 10 mm s/ talón de viga.
13 Viga portante premoldeada pretensada "L" 30/70, talón 20 cm.
14 Cordones de pretensado Ø 12,7 mm.
15 Columna premoldeada H°A° 40x40.
16 Ménsula corta + apoyo de neopreno 10 mm.
17 Bulón Ø 20 ménsula–viga en vaina grouteada.
18 Unión mecánica panel–viga: perfil L 100x10 galv., bulón M16 a inserto + anclaje químico.
19 Perfil L de restricción inferior del panel.
20 Lana mineral 50 mm en cámara panel–viga.
21 H° de relleno in situ s/ chapa galv. (cierre de cámara).
22 Montante de aluminio 50x150.
23 Travesaño superior 50x120 + presor + tapa + burletes EPDM.
24 DVH 6 templado + 12 + 3+3 laminado.
25 Grapa superior montante–viga, anclaje químico M12.
26 Sellador silicona neutra + fondo de junta (travesaño/panel).
27 Cielorraso suspendido placa de roca de yeso 12,5 mm s/ perfilería galv.
28 Media caña de mortero (encuentro losa–parapeto).

DETALLE 2 · NUDO ENTREPISO

AXONOMETRÍA · ESC. APROX. 1:22

Unión columna–ménsula–viga–losa · anclaje del muro cortina · spandrel y barrera cortafuego

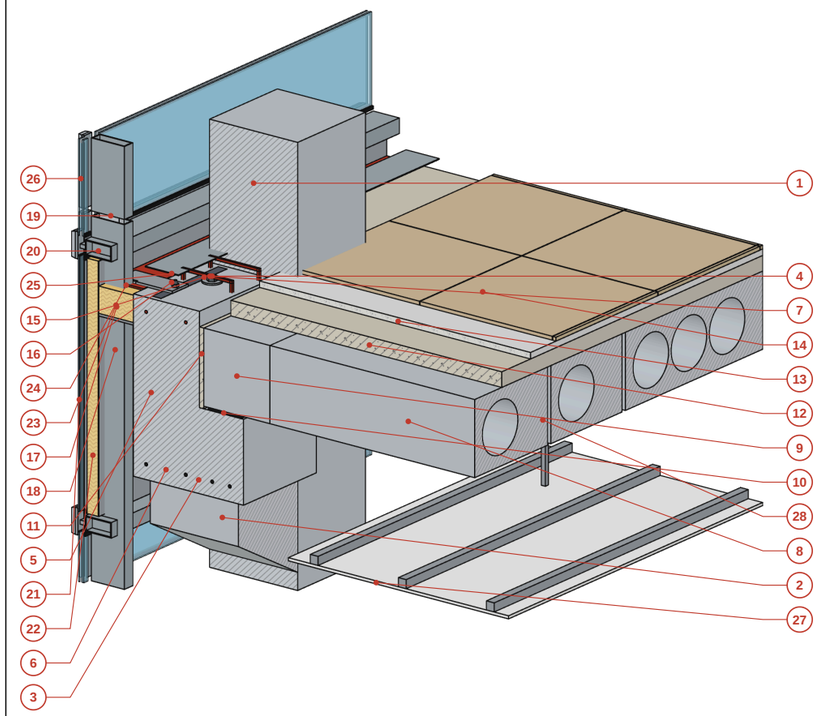


1 Columna premoldeada H°A° 40x40 H-30 (continua en altura).
2 Ménsula corta de columna (premoldeada con la columna).
3 Apoyo de neopreno 10 mm (ménsula/viga).
4 Bulón Ø 20 en vaina, arandela + tuerca en cajeado; llenado c/ grout.
5 Viga portante premoldeada pretensada "L" 30/70.
6 Cordones de pretensado Ø 12,7 mm.
7 Estribos salientes + barras de vinculación Ø 10 c/ 50 cm (diafragma).
8 Losa alveolar pretensada e = 30 cm.
9 Tapón de H° en alvéolos de apoyo.
10 Neopreno continuo losa / talón de viga.
11 Junta viga–losa llenada c/ H° in situ (llave de corte).
12 Capa de compresión H°A° in situ 6 cm c/ malla Q188.
13 Carpeta de nivelación 2,5 cm.
14 Porcelanato 60x60 s/ adhesivo cementicio.
15 Riel de anclaje embutido (tipo Halfen) + bulón T M12.
16 Grapa de anclaje acero galv. regulable 3D (agujeros colisos).
17 Bulón M12 inox montante–grapa c/ arandelas aislantes (par galvánico).
18 Montante de aluminio 50x150.
19 Junta de dilatación de montante 20 mm c/ manguito interior.
20 Travesaño 50x120 + presor + tapa + burletes EPDM.
21 Spandrel: vidrio templado 6 mm esmaltado.
22 Lana mineral 50 mm + bandeja de chapa galv. (back-pan).
23 Barrera cortafuego: lana mineral 100 kg/m³ s/ chapa galv.
24 Sellador intumescente (sello de humo y fuego).
25 Cubrejunta de aluminio.
26 DVH 6 + 12 + 3+3 laminado (visión).
27 Cielorraso suspendido placa de roca de yeso 12,5 mm.
28 Vela rígida galv. colgada de la losa.

DETALLE 3 · NUDO PISO SOBRE TERRENO

AXONOMETRÍA · ESC. APROX. 1:27

Base + tintero + columna empotrada – viga de fundación – piso – arranque del muro cortina

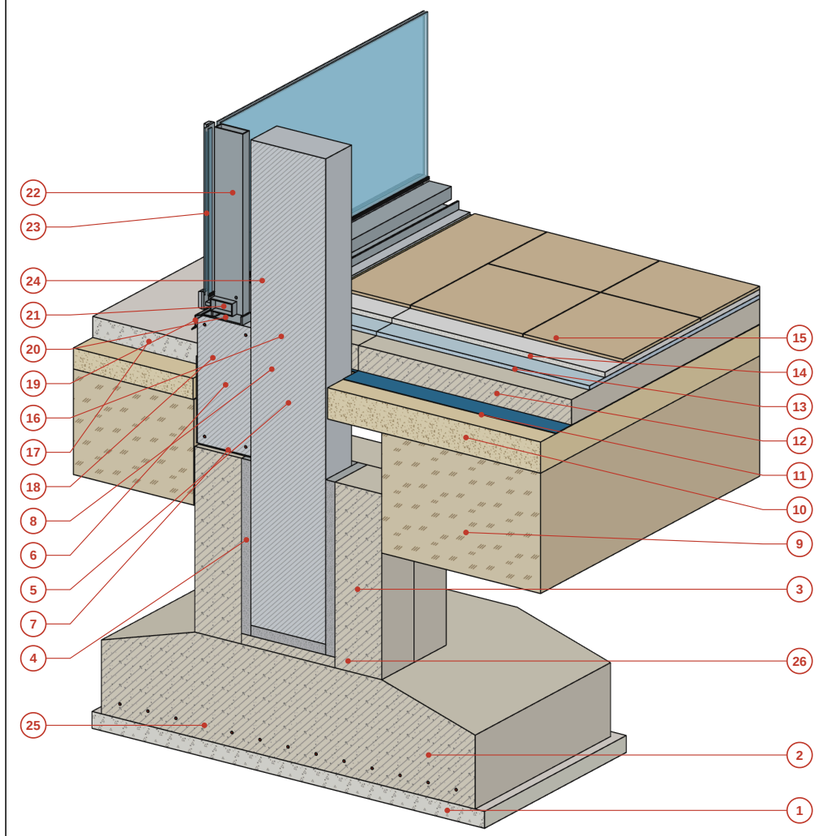

1 Hormigón de limpieza H-8, e = 8 cm.
2 Base aislada H°A° in situ H-25 (s/ cálculo y estudio de suelos).
3 Tintero / cáliz H°A° in situ (empotramiento ≥ 1,5 b).
4 Grout cementicio sin retracción (llenado columna–tintero).
5 Columna premoldeada H°A° 40x40 (corte por eje).
6 Viga de fundación premoldeada H°A° 30x61 (VF).
7 Apoyo de neopreno 10 mm VF / tintero.
8 Aislación hidrófuga vertical: pintura asfáltica + film.
9 Suelo natural compactado.
10 Tosca compactada e = 15 cm.
11 Film de polietileno 200 µ.
12 Contrapiso H°A° e = 12 cm c/ malla Q188.
13 Carpeta hidrófuga 2 cm.
14 Carpeta de nivelación 2,5 cm.
15 Porcelanato 60x60 s/ adhesivo.
16 Junta perimetral EPS 20 mm + sellador.
17 Vereda de H° peinado 10 cm s/ tosca.
18 Junta de vereda c/ sellador.
19 Babeta chapa galv. N°24 c/ goterón.
20 Perfil de arranque alum. c/ drenaje + tarugos a VF.
21 Travesaño inferior + presor + tapa + burletes.
22 Montante de aluminio 50x150.
23 DVH 6 + 12 + 3+3 laminado.
24 Grapa inferior acero galv. (anclaje a VF).
25 Parrilla de armadura de la base (Ø s/ cálculo).
26 Fondo de cáliz / asiento de columna c/ grout (5 cm).

H°A° premoldeado · H°A° in situ · H° simple · Mortero · Grout · EPS · Lana mineral · Vidrio · Aluminio · Acero galv. · Neopreno / sellador · Armaduras

LÁMINA 2 · DETALLES CONSTRUCTIVOS EN 3D DE LOS NUDOS

Sistema de hormigón premoldeado de grandes luces · Cerramiento vidriado – muro cortina (sistema stick, módulo 1,25 m)

Axonometrías seccionadas en el plano de corte del corte integral; capas escalonadas para mostrar cada material. Cotas y especificaciones idem Lámina 1 (corte 1:20).

MATERIA	CÁTEDRA	ALUMNO/A	GRUPO	HOJA
Construcciones II	Arq. _____	_____	____	2 de 2 · A3 · 2026
