

4° MURO EXTERIOR OPACO: PANEL SÁNDWICH (INTEGRAL) LÁMINA 14/15

Panel metálico autoportante con núcleo aislante, colocado horizontal entre columnas - laterales y contrafrente


1 ELEVACIÓN LATERAL (EJE 1) ESC. 1:200

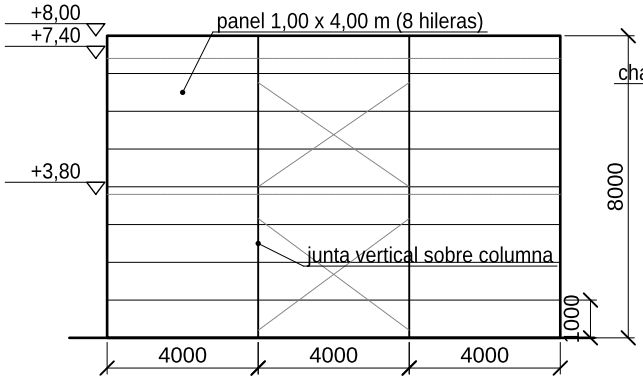

2 SECCIÓN DE UN PANEL (TRANSVERSAL) ESC. 1:12,5

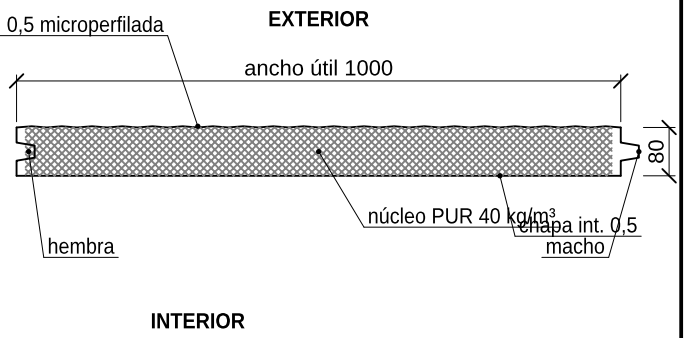

3 JUNTA HORIZONTAL MACHIHEMBRADA ESC. 1:2

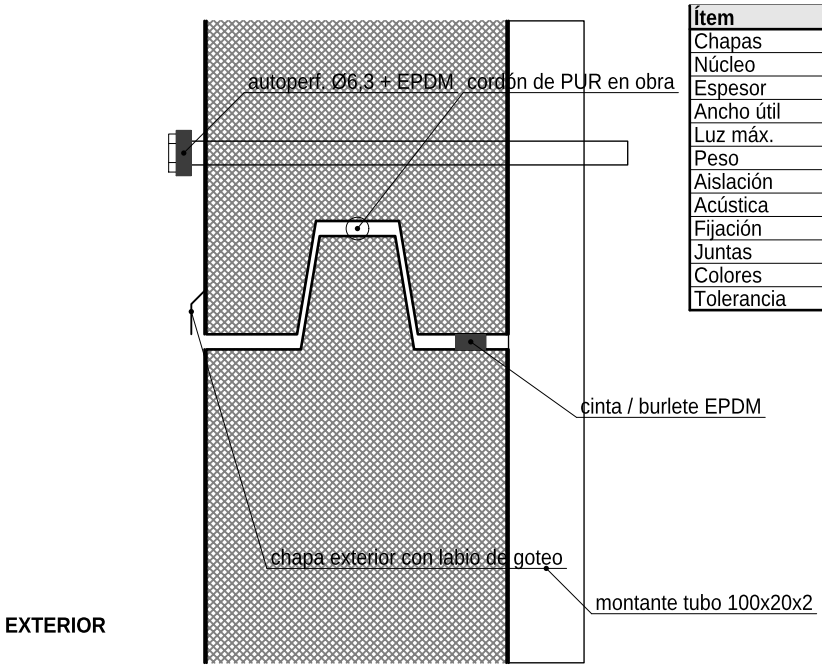

4 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Ítem	Valor
Chapas	acero galv. Z275 prepintado e = 0,5 mm; poliéster 25 µm
Núcleo	poliuretano inyectado PUR 40 kg/m³ (opción PIR por fuego)
Espesor	80 mm (hay 30 a 150 mm)
Ancho útil	1,00 m; largo a medida hasta 12 m (adoptado 4,00 m)
Luz máx.	4,50 m entre apoyos con viento 100 kg/m²
Peso	≈ 11 kg/m²
Aislación	λ 0,022 W/m·K -> U ≈ 0,27 W/m²·K
Acústica	Rw ≈ 25 dB
Fijación	2 autoperforantes Ø6,3 + EPDM por panel y apoyo
Juntas	machihembrada horiz.; vertical 10 mm sellada + tapajunta
Colores	carta RAL; film protector que se retira al final
Tolerancia	espesor ±2 mm; largo ±5 mm

5 MONTAJE Y FUNCIÓN

1. Nivelar y anclar la viga portapanel a la fundación.
2. Soldar los montantes 100x20 a las alas de las columnas.
3. Fijar el perfil U de arranque con babeta y la cinta butílica.
4. Montar de abajo hacia arriba, macho arriba, con ventosa/pinza.
5. Fijar cada panel en cada apoyo con 2 tornillos sin aplastar el núcleo.
6. Sellar juntas verticales, tapajuntas, cupertina; retirar el film.

Función: cerramiento integral: en una sola pieza resuelve terminación exterior, aislación térmica, barrera de vapor y terminación interior.
Ventajas: liviano, rápido (≈ 150 m²/día por cuadrilla), muy aislante, montaje en seco.
Desventajas: opaco; sensible a golpes; PUR combustible (usar PIR o lana mineral si se exige fuego).
