
1º ELEMENTOS · E5 VIGA VP T INVERTIDA h 0,75

Viga portante principal pretensada (perpendicular a la fachada): recibe los paneles TT en sus talones


ELEVACIÓN

esc. 1:100 · en trazos: nervios de los TT apoyados en los talones




SECCIÓN TRANSVERSAL

esc. 1:10

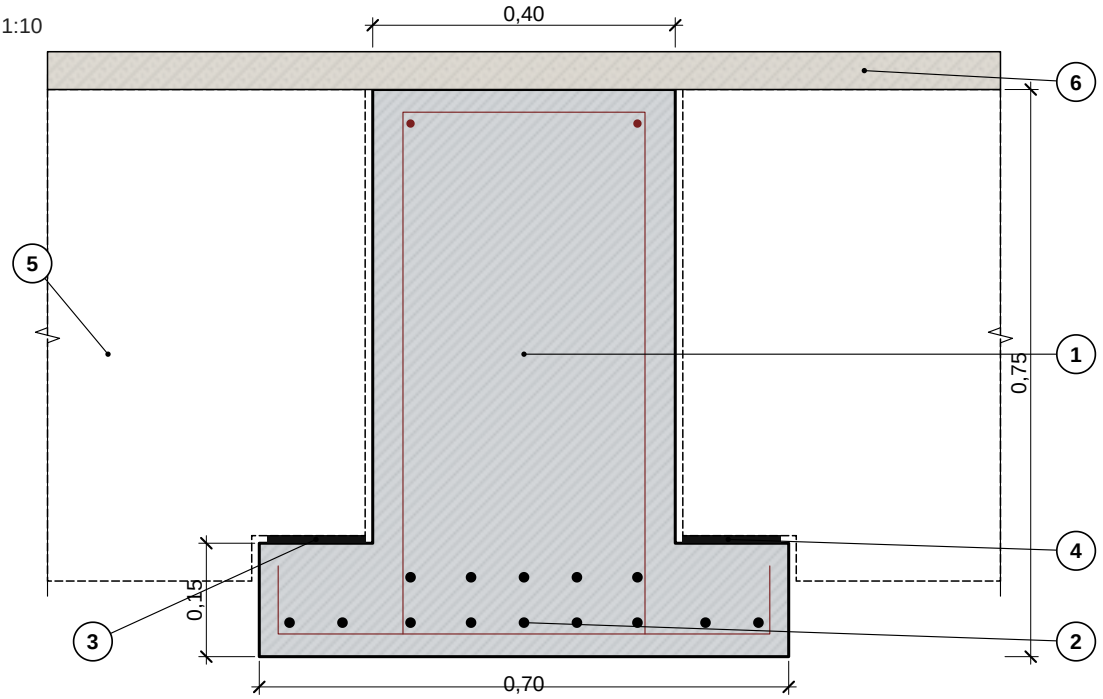

ISOMETRÍA

1:50

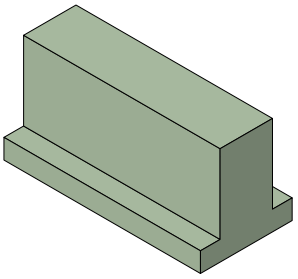

1. VP T invertida h 0,75 pretensada (E5)
2. Cordones Ø12,7 (14) en talón y alma
3. Talones 15x15: apoyo de los nervios TT
4. Neopreno 10 mm (nervio TT / talón)
5. Extremo del TT: nervio c/ rebaje (dap)
6. Capa de compresión in situ (continuidad)

Catálogo	h (m)	Luz	Peso
VL doble T	0,50-1,20	6-18 m	0,45 t/m
Viga L	0,26-0,60	5-12 m	0,19 t/m
VP T inv.	0,60-1,40	8-20 m	0,86 t/m

ESPECIFICACIÓN

Función: viga PORTANTE principal: recibe los TT en sus talones y descarga en las ménsulas de las columnas.
Medidas / peso: ancho 0,70 (alma 0,40) · h 0,75 · L 14,58 m · ≈ 12,6 t (pieza más pesada de la obra).
Especificación: H-45, 23 cordones Ø12,7; contraflecha ≈ L/500; neopreno + perno Ø20 en cada apoyo.
Colocación: llega en carretón (> 12 m); izado c/ balancín; se montan los TT simétricos a ambos lados (evita torsión).

PARA ESTUDIAR · IDEAS CLAVE

- La VP es la viga PORTANTE principal: salva la luz mayor (15 m) y recibe los paneles TT.
- T invertida: los talones inferiores sirven de apoyo a los TT, así el piso queda a la altura de la cara superior de la viga (menos altura total).
- Es la pieza más pesada (≈ 12,6 t): define la grúa, el transporte y el plan de montaje.
- Se montan los TT simétricos a ambos lados para que la viga no se torsione.
