
2º JUNTAS Y UNIONES · DETALLES J1 A J4

Uniones de la estructura premoldeada (numeración de la lámina 09)

J1 Columna / cáliz


Corte 1:20 · unión húmeda, empotramiento

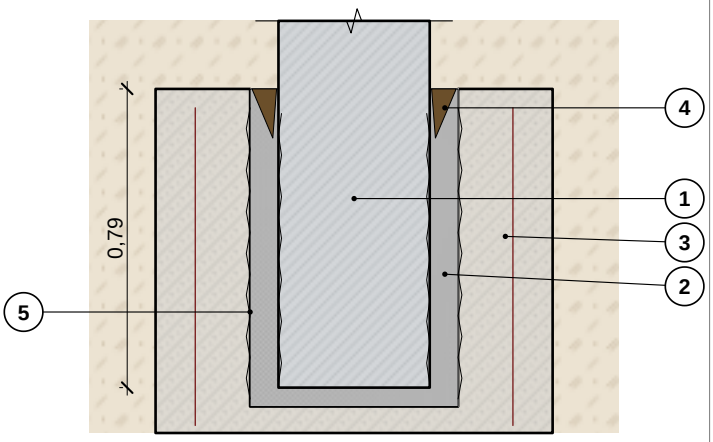

1. Columna premoldeada 40x40, superficie rugosa en el tramo empotrado
2. Grout sin retracción ≥ 30 MPa en la holgura de 7,5 cm
3. Cuello (cáliz) H°A° in situ, pared 0,25 m
4. Cuña de madera dura (aplomado ± 5 mm), se retira a las 24 h
5. Llaves de corte en el alvéolo: transmiten el momento

J2 Viga VL / ménsula de columna


Corte longitudinal 1:20 · unión seca articulada

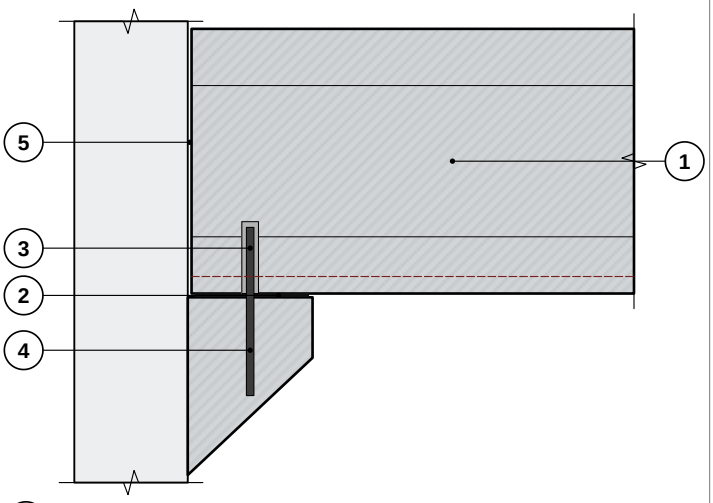

1. VL doble T 40x70 pretensada (apoyo ≥ 15 cm)
2. Neopreno zunchado 10 mm (giro y dilatación libres)
3. Vaina Ø40 en la viga rellena c/ grout (2 por apoyo)
4. Perno Ø20 anclado en la ménsula: antivuelco
5. Junta 1 cm viga / columna (sin contacto)

J3 Viga VP / ménsula de columna


Corte longitudinal 1:20 · unión seca articulada

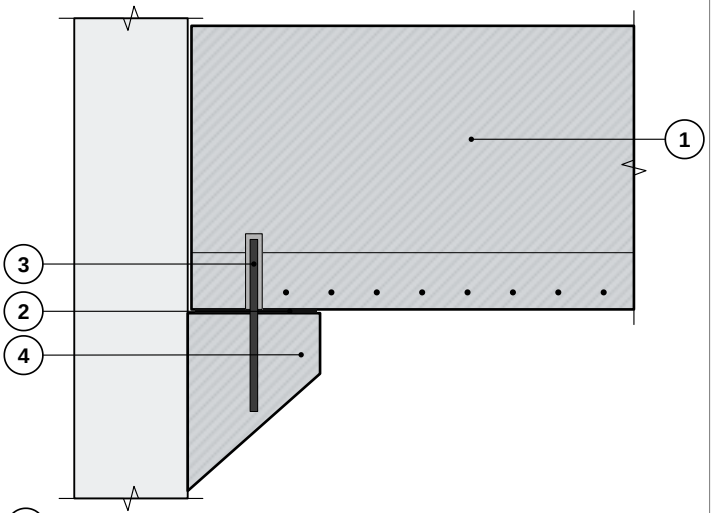

1. VP T invertida h 0,75 (12,6 t): apoyo ≥ 20 cm
2. Neopreno 10 mm 300 x 320
3. Perno Ø20 en vaina Ø40 c/ grout (1 por apoyo)
4. Ménsula corta c/ diagonal: tensor sup. Ø16 + estribos
5. Orden: VP antes que los TT; las vainas se rellenan al final del nivel

J4 Viga L de borde / VL

Corte transversal 1:10 · unión húmeda rígida

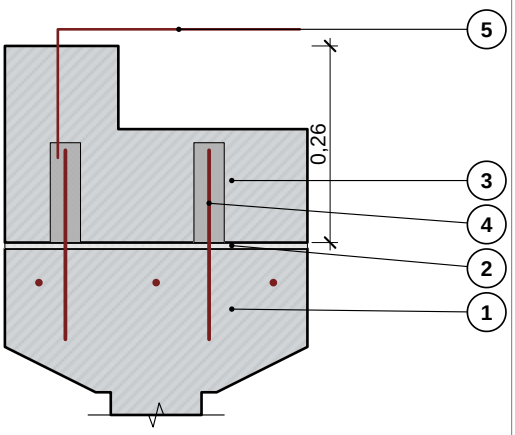

1. Ala superior de la VL doble T
2. Cama de mortero 1:3, e = 8 mm (nivela y reparte)
3. Viga L de borde premoldeada
4. 2 barras Ø12 c/ 60 cm salientes de la VL, en vainas Ø40 de la L c/ grout
5. Estribos salientes 2Ø10: anclan la capa
