
1º ELEMENTOS · E1 FUNDACIÓN TIPO CÁLIZ

Base y cuello de H°A° colados in situ que reciben y empotran la columna premoldeada


CORTE POR EJE DE COLUMNA

esc. 1:25

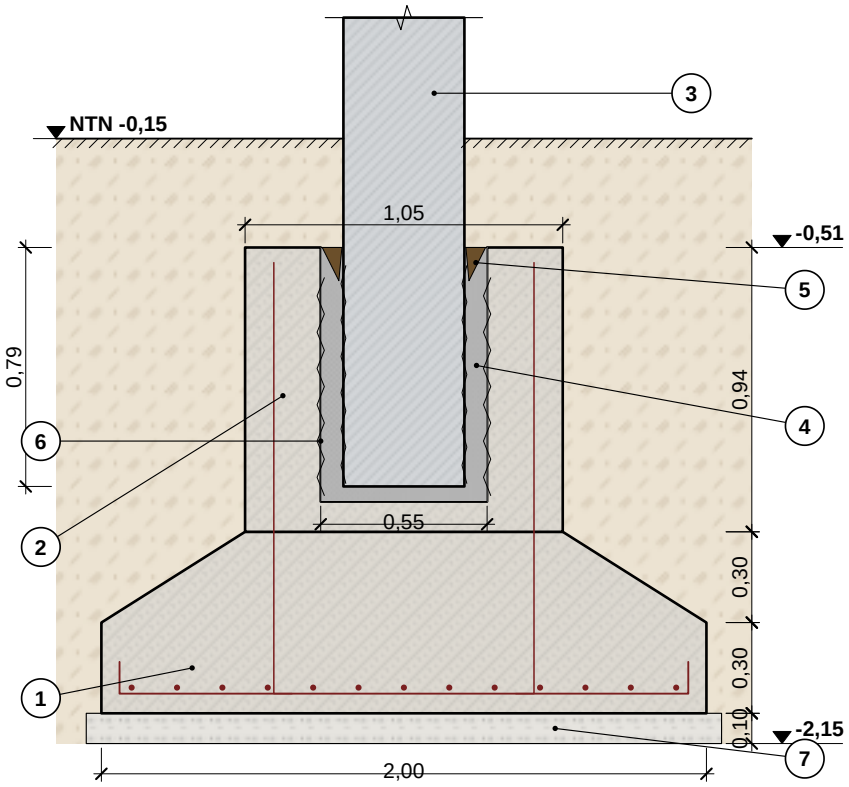

PLANTA

esc. 1:50

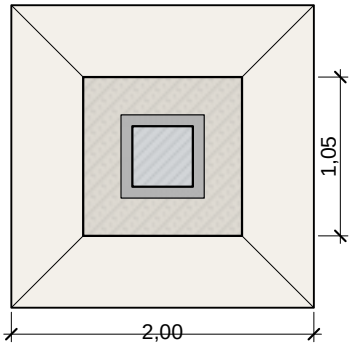

Holgura columna / alvéolo: 7,5 cm por lado para aplomar.

REFERENCIAS

1. Base H°A° H-25 colada in situ, parrilla Ø12 c/15
2. Cuello (cáliz) H°A° in situ, pared e = 0,25 m
3. Columna premoldeada 40x40 (E2)
4. Relleno microhormigón / grout sin retracción
5. Cuñas de madera dura o acero p/ aplomar (se retiran)
6. Llaves de corte (superficie rugosa) en alvéolo y columna
7. H° de limpieza H-8, e = 0,10 m

ESPECIFICACIÓN

Función: transmitir al suelo las cargas de la columna y materializar su EMPOTRAMIENTO: la estructura premoldeada (vigas articuladas) se estabiliza por las columnas empotradas.

Medidas: base 2,00 x 2,00 x 0,30 + tronco 0,30; cuello 1,05 x 1,05; alvéolo 0,55 x 0,55, prof. 0,84; fundación a -2,15 (s/ estudio de suelos).

Máx./mín.: empotramiento ≥ 1,5 a 2 veces el lado de la columna (mín. 0,60 m); pared del cáliz ≥ 0,20 m; holgura 5 a 8 cm por lado.

Materiales: H-25, acero ADN 420, recubrimiento 5 cm; relleno grout cementicio sin retracción ≥ 30 MPa.

Colocación: excavar, H° de limpieza, armar base y cuello, encofrar el alvéolo con molde rugoso, hormigonar; montar la columna, aplomar con cuñas y puntales, rellenar con grout y retirar cuñas a las 24-48 h.
