
3º MÁQUINAS · ACCESO A OBRA E IMPLANTACIÓN

Dónde entra, se arma y trabaja la grúa · montaje en retroceso (de fondo a frente) · lote 60 x 48 m

IMPLANTACIÓN DE OBRA

esc. 1:500

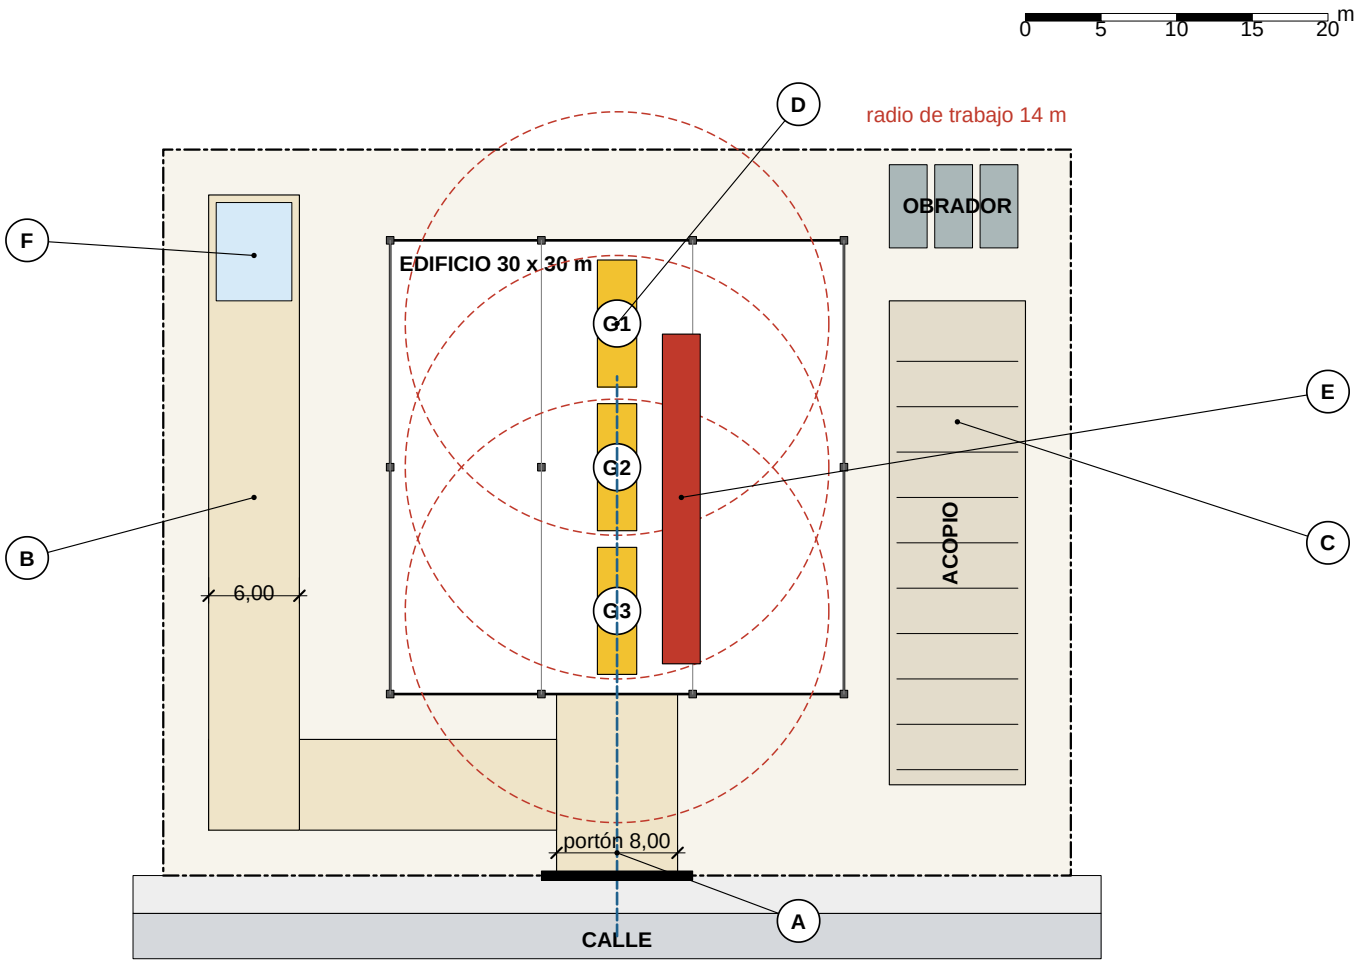

(A) Acceso: portón 8 m, camino de tosca compactada 30 cm, ancho ≥ 6 m, pendiente ≤ 8 %
(B) Calle interna p/ equipos menores y hormigón de la capa (mixer + bomba)
(C) Acopio mínimo de piezas, ordenadas según el montaje, sobre tacos
(D) Estaciones de la grúa G1 → G2 → G3: monta de fondo a frente y sale por el acceso
(E) Carretón junto a la grúa: izaje directo desde el camión (just in time)
(F) Plataforma elevadora y equipo de grouteo

CONDICIONES DE ACCESO (verificar antes de contratar)

Camino: ancho libre ≥ 6 m (carretón 2,60 m + maniobra), radio de giro exterior ≥ 15 m, pendiente ≤ 8 %, base compactada.

Gálibo: altura libre ≥ 4,50 m en el recorrido; sin líneas aéreas a menos de 5 m de la pluma.

Calle: señalización, banderilleros y corte parcial en el horario autorizado por el municipio (piezas > 12 m).

PARA ESTUDIAR · IDEAS CLAVE

- Antes de alquilar la grúa se verifica que el equipo y el camión PUEDAN ENTRAR: ancho, giro, pendiente, altura libre y suelo firme.
- Montaje en retroceso: la grúa empieza en el fondo y retrocede hacia el acceso, así nunca queda encerrada.
- El camión se ubica al alcance de la grúa y se iza directo; el acopio es mínimo y ordenado.
