

1º ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DEL SISTEMA · 2/3

Vigas premoldeadas pretensadas: VL de fachada (+ viga L de borde) y VP portante principal

ELEVACIONES 1:150







RANGOS DE CATÁLOGO (orientativo)


Pieza	h (m)	Luz usual	Peso
VL doble T	0,50-1,20	6-18 m	0,45 t/m
Viga L borde	0,26-0,60	5-12 m	0,19 t/m
VP T invert.	0,60-1,40	8-20 m	0,86 t/m
Esbeltez	h ≈ L/15 a L/20		

SECCIONES TRANSVERSALES 1:20

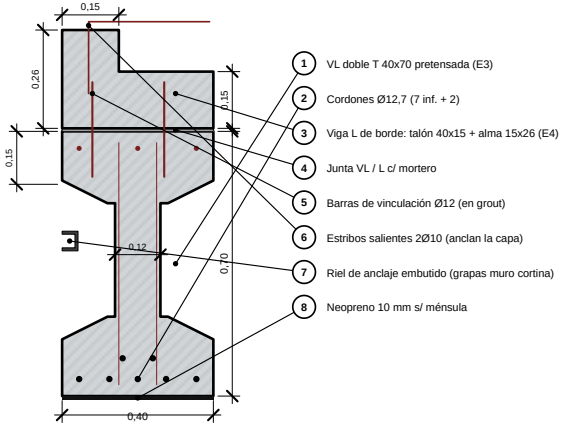

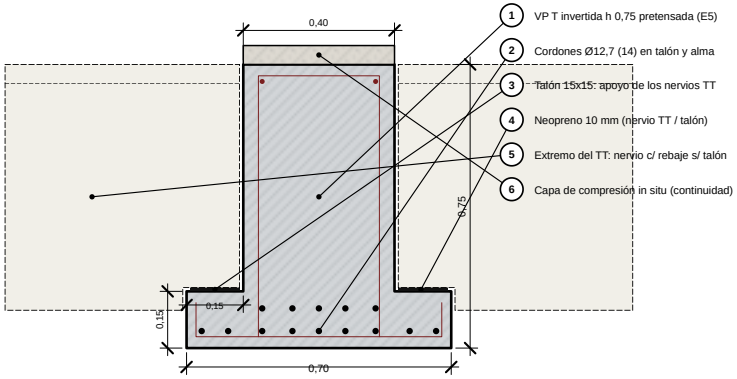

Isometrías 1:50 (tramo de 1,50 m)

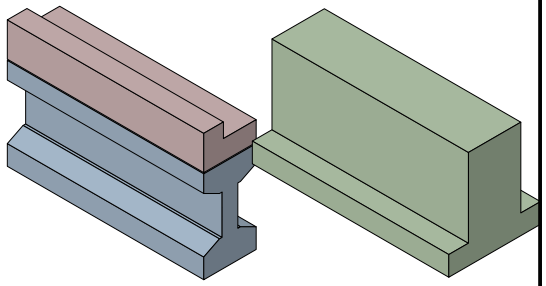

E3 VL + E4 L — E5 VP

E3 · Viga VL doble T 40x70

Función: viga perimetral de fachada: atar las columnas, recibir la viga L y el cerramiento (riel p/ grapas del muro cortina o bulones del panel).

Medidas: b 0,40 · h 0,70 · alas 0,15 · alma 0,12 · largo 9,58 m · ≈ 4,4 t.

Especificación: H-45, pretensado c/ 9 cordones Ø12,7; apoyo s/ neopreno 10 mm y 2 pernos Ø20 en vainas c/ grout (antivuelco).

Colocación: izado c/ balancín por 2 insertos a L/5 de los extremos; apoyo mín. 15 cm en la ménsula.

E4 · Viga L de borde

Función: completar la altura hasta el nivel de losa, recibir el ala del TT en su talón y confinar la capa de compresión en el borde.

Medidas: talón 0,40 x 0,15 + alma 0,15 x 0,26 · largo 9,58 m · ≈ 1,8 t.

Especificación: H-40 armado; barras de vinculación Ø12 a la VL en grout; estribos salientes 2Ø10.

Colocación: se monta sobre la VL ya fijada, con cama de mortero 8 mm; luego se colocan los TT.

E5 · Viga VP T invertida h 0,75

Función: viga PORTANTE principal (perpendicular a fachada): recibe los paneles TT en sus talones y descarga en las ménsulas de columna.

Medidas: alma 0,40 · talones 0,15 x 0,15 · ancho 0,70 · h 0,75 · L 14,58 m · ≈ 12,6 t (pieza más pesada de la obra).

Especificación: H-45, pretensado c/ 23 cordones Ø12,7; contraflecha de pretensado ≈ L/500; neopreno + perno Ø20 en cada apoyo.

Colocación: transporte en carretón (> 12 m); izado c/ balancín y 2 eslingas; montaje simétrico de TT a ambos lados para evitar torsión.
