
1º ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DEL SISTEMA · 3/3

Panel TT pretensado de entrepiso y cubierta, capa de compresión in situ y piezas de apoyo / vinculación


E6 · PANEL TT 2,40 x 0,65 + E7 CAPA

Sección transversal 1:20

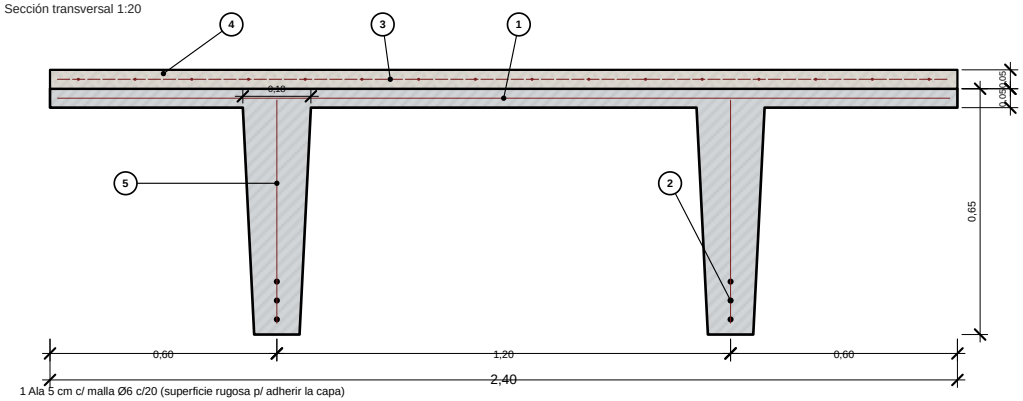


1 Ala 5 cm c/ malla Ø6 c/20 (superficie rugosa p/ adherir la capa)
2 Nervio 18/12 c/ 3 cordones Ø12,7 pretensados
3 Capa de compresión H-25 in situ e = 5 cm (E7)
4 Malla soldada Ø6 c/15 x 15
5 Estribos / conectores salientes Ø6 en nervios

Elevación longitudinal y planta 1:100

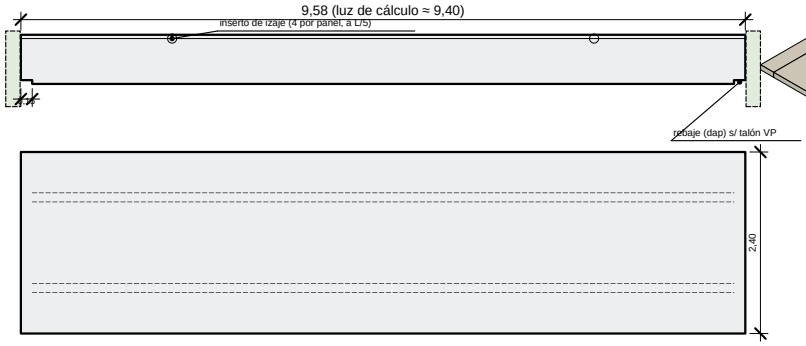


VP en trazos a ambos extremos · nervios en trazos (vista desde arriba)

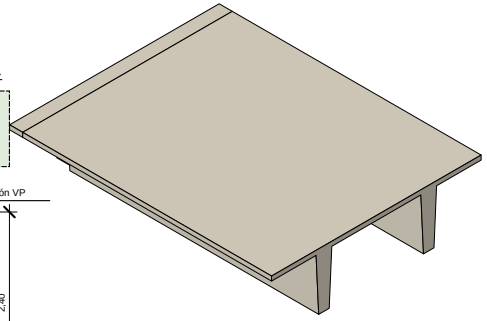

Isometría 1:75 (extremo c/ rebaje)


E8 · APOYOS Y CONECTORES

a) Neopreno zunchado 1:10




Placa dureza 60 Shore A, e = 10 mm,
c/ chapas de acero; σ adm = 7-10 MPa

b) Perno Ø20 + vaina Ø40 1:20




c) Riel de anclaje embutido 1:5



Perfil C 52/34 galv. + bulón T M12;
regulación lateral de la grapa ± 25 mm

d) Inserto de izaje 1:10



Capacidad s/ catálogo: 2,5 - 10 t c/u

E6 · Panel TT h 0,65 x 2,40

Función: losa de entrepiso y cubierta de gran luz sin apuntalar; apoya sus nervios en los talones de las VP.
Medidas: 2,40 x 0,65; ala 5 cm; nervios 18/12 a 1,20; largo 9,58 m · ≈ 0,30 m²/m · 7,2 t.
Máx./mín.: luces de catálogo 6 a 18 m (h 0,40 a 0,80); apoyo mín. 10 cm; sobrecarga útil ≈ 500 kg/m².
Colocación: izado por 4 insertos con balancín; se apoya s/ neopreno 10 mm, se alinea y se sueldan las chapas de borde entre paneles.

E7 · Capa de compresión

Función: monolitizar los paneles (diafragma rígido), repartir cargas y absorber el momento negativo sobre apoyos.
Medidas: e = 5 cm (mín. 5, usual 5-8) sobre el ala, H-25; malla Ø6 c/15 + barras de continuidad sobre las VP.
Colocación: limpiar y humedecer el ala rugosa, colocar malla c/ separadores, hormigonar con bomba y curar 7 días; el TT actúa de encofrado perdido.

E8 · Apoyos y conectores

Neopreno: placas zunchadas e = 10 mm bajo VL, VP y TT: reparten carga y permiten giros y dilataciones (apoyo articulado).
Pernos: Ø20 anclados en la ménsula, entran en vainas Ø40 de la viga que se rellenan c/ grout: impiden vuelco y desplazamiento.
Grout: mortero cementicio fluido sin retracción ≥ 40 MPa p/ vainas, juntas y cáliz.
Riel / insertos: embutidos en fábrica (riel C p/ grapas del muro cortina, insertos de izaje y placas de soldadura).
