
3º MÁQUINAS Y DISPOSITIVOS DE MONTAJE · 1/3

Equipos para transportar, izar y posicionar las piezas premoldeadas (pieza crítica: VP 14,58 m · 12,6 t)

M1 · GRÚA TELESCÓPICA AUTOPROPULSADA 90 t

Vista lateral 1:300 · izando una VP al nivel +4,50

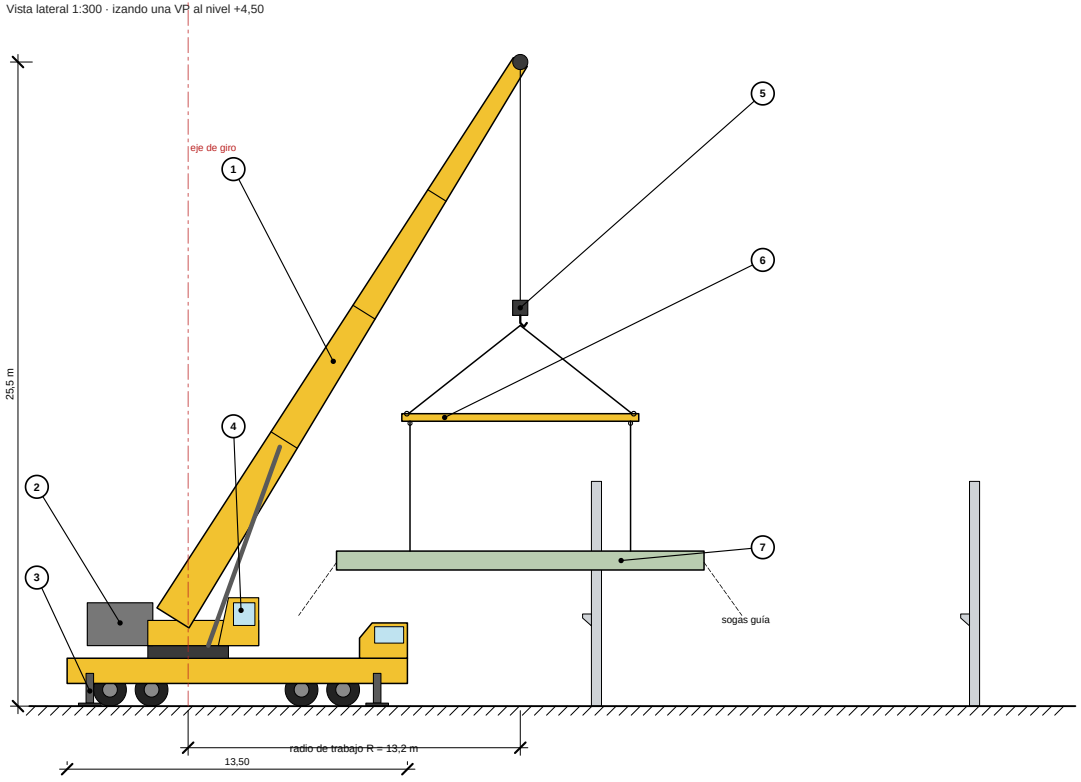

Función y uso

M1 Grúa: eleva y posiciona columnas, vigas y TT; trabaja SIEMPRE sobre estabilizadores extendidos y placas de reparto sobre suelo compactado.

Capacidad: 90 t nominal (a 3 m); se elige por el par carga x radio de la pieza más pesada y más lejana, no por la capacidad nominal.

M2 Carretón: semirremolque extensible 12-25 m, capacidad 30 t; las piezas > 12 m o > 2,60 m de ancho viajan c/ permiso y escolta.

M3 Balancín: reparte la carga en 2 o 4 puntos con tiros verticales: evita compresión axial en la pieza y flexión no prevista; las eslingas a la grúa forman ≥ 45° con la horizontal.

Señalero: rigger habilitado coordina por radio con el operador; zona de exclusión bajo la carga.

1 Pluma telescópica 4 tramos (26 m de trabajo)

2 Contrapeso desmontable (viaja en camión aparte)

3 Estabilizadores c/ placas de reparto 0,9 x 0,9

4 Cabina de operación (giro 360°)

5 Pasteca y gancho c/ seguro

6 Balancín de izaje (M3)

7 VP 14,58 m · 12,6 t


TABLA DE CARGA (pluma 26 m, contrapeso total, 360°)

R (m)	8	10	12	14	16	18
Cap. (t)	38,0	30,5	24,0	19,5	16,0	13,0

Verificación: VP 12,6 t + balancín 0,8 t + eslingas 0,2 t = 13,6 t ≤ 0,75 x 19,5 t (R = 14 m) → 14,6 t ✓. Se usa la tabla del fabricante del equipo alquilado.


M2 · TRACTOR + SEMIRREMOLQUE CARRETÓN EXTENSIBLE

Vista lateral 1:200 · transporte de la VP (pieza > 12 m)

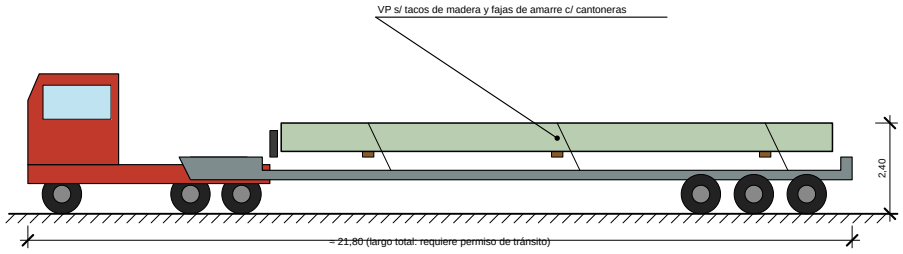

M3 · BALANCÍN (VIGA DE IZAJE) + ESLINGAS

Esquema 1:100 · izaje de un panel TT (4 insertos)

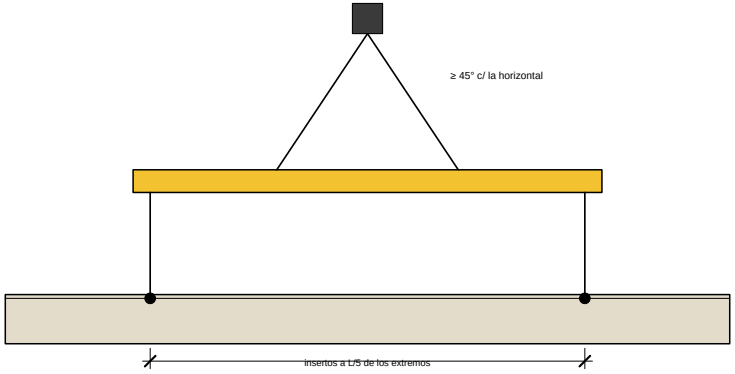

Accesorios

- Grillete tipo lira c/ perno roscado
- Eslinga de cable de acero o faja poliéster (c/ etiqueta CMU)
- Argolla giratoria roscada al inserto
- Gancho c/ lengüeta de seguridad
- Sogas guía (vientos) p/ orientar la pieza
- Cuñas, calces y cantoneras
